

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭।

[www.lged.gov.bd](http://www.lged.gov.bd)



“শেখ হাসিনার মূলনীতি  
গ্রাম শহরের উন্নতি”

স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৯২২.৯৯.৩৪.২১- ৩৬৬৭

তারিখ : ০৩/০৩/২০২২ খ্রিঃ

প্রতি,

নির্বাহী প্রকৌশলী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা : বগুড়া।

বিষয় : “দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” - এর প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ২০/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে বগুড়া জেলার বিভিন্ন উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কাজের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : ৪৬.০২.০০০০.৯২২.২৫.০৪.২০২১-৩৬০৪, তারিখ : ১৭/০২/২০২২ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ২০/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে বগুড়া জেলার বিভিন্ন উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত ট্রাফিসমূহ প্রকল্প পরিচালক - এর সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধনপূর্বক তার বিস্তারিত সচিত্র প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক বরাবর এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

এখানে উল্লেখ্য যে, **Design ও Specification** বহির্ভূত কোন কাজের বিল পরিশোধ করা যাবে না। ট্রাফিপূর্ণ কাজের বিল প্রস্তুতকারী ও অনুমোদনকারী ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

বিষয়টি অতীব জরুরী।

(স্বপন কান্তি পাল)

প্রকল্প পরিচালক

ফোন : ০২-৪৪৮২৬৩২৮

ইমেইল: [pd.crmidp@lged.gov.bd](mailto:pd.crmidp@lged.gov.bd)

অনুলিপি :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, রাজশাহী বিভাগ, জেলা : রাজশাহী।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, বগুড়া অঞ্চল, জেলা : বগুড়া।
- ৫। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলা : সোনাতলা/গাবতলী/দুপচাঁচিয়া/আদমদিঘী/নন্দীগ্রাম, জেলা : বগুড়া।


**দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)**  
**পরিদর্শন প্রতিবেদন**

বিভাগ : রাজশাহী      জেলা : বগুড়া      উপজেলা : সোনাতলা

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্কীমের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা			ত্রুটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা ও মন্তব্য
				Item	Design Specification	Field Observation	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১।	২০/০২/২০২২ খ্রিঃ	বগুড়া/ সোনাতলা	Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4- Storeyed Foundation) at <b>Baluahat Hat</b> , under Upazila : <b>Sonatola</b> , District : <b>Bogura</b> .	<b>Drain at Platform</b>	-	- গ্রাউন্ড ফ্লোর-এ প্লাটফর্মের এর ড্রেন ডিজাইন অনুযায়ী করা হয়নি।	- ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাউন্ড ফ্লোর-এ প্লাটফর্মের ড্রেন সঠিকভাবে করতে হবে।
			প্রকল্প/কর্মসূচির নাম : CRMIDP চুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ০৮.০৮.২০১৯ খ্রিঃ ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা : M/S Jerin Enterprise. প্রাকল্পিত মূল্য : ৩,০৮,০০,০০০.০০ টাকা চুক্তিমূল্য : ২,৭০,৫১,৬৪০.০০ টাকা চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ : ০১.০৮.২০২১ খ্রিঃ বর্তমান অগ্রগতি : ১০০%	<b>Collapsible Gate</b>	-	- Collapsible Gate ফ্লোর লেভেল থেকে আপ করে সংযোজন করা হয়েছে।	- Collapsible Gate ফ্লোর লেভেলে ফ্লাস করে স্থাপন করতে হবে।
				<b>SS Railling at Stair</b>	-	- স্পেসিফিকেশন ও ডিজাইন অনুযায়ী সিঁড়ির রেলিং স্থাপন করা হয়নি।	- স্পেসিফিকেশন ও ডিজাইন অনুযায়ী সিঁড়ির রেলিং স্থাপন করতে হবে।
				<b>Water Supply Line at Roof Top</b>	-	- Roof Top - এ পানির পাইপ লাইন সঠিকভাবে স্থাপন করা হয়নি।	- ডিজাইন ও ড্রইং অনুযায়ী Roof Top পানির পাইপ লাইন সঠিকভাবে স্থাপন করতে হবে।

**মন্তব্য :** স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

  
(শাকিল হাওলাদার)  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

  
(স্বপন কান্তি পাল)  
প্রকল্প পরিচালক






**Baluahat Hat, under Upazila : Sonatola, District : Bogura.**



**Baluahat Hat, under Upazila : Sonatola, District : Bogura.**



**Baluahat Hat, under Upazila : Sonatola, District : Bogura.**

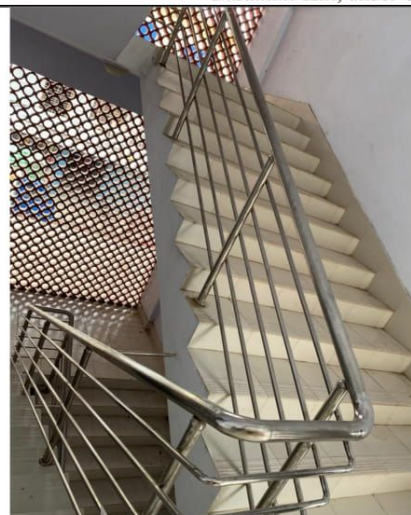

**Baluahat Hat, under Upazila : Sonatola, District : Bogura.**






**দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)**  
**পরিদর্শন প্রতিবেদন**

বিভাগ : রাজশাহী      জেলা : বগুড়া      উপজেলা : গাবতলী

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্কীমের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা			ত্রুটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা ও মন্তব্য																				
				Item	Design Specification	Field Observation																					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮																				
০২।	২০/০২/২০২২ খ্রিঃ	বগুড়া/ গাবতলী	Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4- Storeyed Foundation) at <b>Mohisaban Hat</b> , under Upazila : <b>Gabtoli</b> , District : <b>Bogura</b> .	<b>Brick Work</b>	-	- ইটের গাঁথুনি কাজের জন্য সাইটে মজুদকৃত ইট খুবই নিম্নমানের। - Grade Beam পর্যন্ত কাজ শেষ।	- সাইটে মজুদকৃত ইট অপসারণ পূর্বক স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ভালো মানের ইট সাইটে মজুদ পূর্বক প্রয়োজনীয় টেস্ট সম্পাদন করে সন্তোষজনক টেস্ট রেজাল্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে ইটের গাঁথুনি, ব্রিক ফ্ল্যাট সলিং (BFS) ও সি সি - এর কাজে ব্যবহার করতে হবে। - কলাম, বীম ও স্লাব-এ স্টীল সাঁটার-এর ব্যবহার নিশ্চিত পূর্বক ঢালাই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। - দ্রুত কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। - সাইটে সুবিধাজনক স্থানে সাইনবোর্ড (৩'x৫') এবং ভবনের 3D-View প্রিন্ট করে স্থাপন করতে হবে।																				
			<table border="0"> <tr> <td>প্রকল্প/কর্মসূচির নাম</td> <td>:</td> <td>CRMIDP</td> </tr> <tr> <td>চুক্তি সম্পাদনের তারিখ</td> <td>:</td> <td>০১.১১.২০২০ খ্রিঃ</td> </tr> <tr> <td>ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা</td> <td>:</td> <td>M/S M.I Trading &amp; Company.</td> </tr> <tr> <td>প্রাক্কলিত মূল্য</td> <td>:</td> <td>২,৫৮,০০,০০০.০০ টাকা</td> </tr> <tr> <td>চুক্তিমূল্য</td> <td>:</td> <td>২,০৪,৫৮,১৯৩.৯৩২টাকা</td> </tr> <tr> <td>চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ</td> <td>:</td> <td>১৯.১১.২০২১ খ্রিঃ</td> </tr> <tr> <td>বর্তমান অগ্রগতি</td> <td>:</td> <td>৩৫%</td> </tr> </table>	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	:	CRMIDP	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	:	০১.১১.২০২০ খ্রিঃ	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	:	M/S M.I Trading & Company.	প্রাক্কলিত মূল্য	:	২,৫৮,০০,০০০.০০ টাকা	চুক্তিমূল্য	:	২,০৪,৫৮,১৯৩.৯৩২টাকা	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	১৯.১১.২০২১ খ্রিঃ	বর্তমান অগ্রগতি	:	৩৫%	<b>Signboard &amp; 3D View</b>	-	
প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	:	CRMIDP																									
চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	:	০১.১১.২০২০ খ্রিঃ																									
ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	:	M/S M.I Trading & Company.																									
প্রাক্কলিত মূল্য	:	২,৫৮,০০,০০০.০০ টাকা																									
চুক্তিমূল্য	:	২,০৪,৫৮,১৯৩.৯৩২টাকা																									
চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	১৯.১১.২০২১ খ্রিঃ																									
বর্তমান অগ্রগতি	:	৩৫%																									

মন্তব্য : স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

  
(শাকিল হাওলাদার)  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

  
(স্বপন কান্তি পাল)  
প্রকল্প পরিচালক





**Mohisaban Hat, under Upazila : Gabtoli, District : Bogura.**



**Mohisaban Hat, under Upazila : Gabtoli, District : Bogura.**



**Mohisaban Hat, under Upazila : Gabtoli, District : Bogura.**



**Mohisaban Hat, under Upazila : Gabtoli, District : Bogura.**



দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

পরিদর্শন প্রতিবেদন

বিভাগ : রাজশাহী জেলা : বগুড়া উপজেলা : দুপচাঁচিয়া

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্কীমের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা			ত্রুটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা ও মন্তব্য														
				Item	Design Specification	Field Observation															
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮														
০৩।	২০/০২/২০২২ খ্রিঃ	বগুড়া/ দুপচাঁচিয়া	Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4- Storeyed Foundation) at <b>Taluch Hat</b> , under Upazila : <b>Dupchanchia</b> , District : <b>Bogura</b> .  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>প্রকল্প/কর্মসূচির নাম</td> <td>: CRMIDP</td> </tr> <tr> <td>চুক্তি সম্পাদনের তারিখ</td> <td>: ২০.০৮.২০১৯ খ্রিঃ</td> </tr> <tr> <td>ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা</td> <td>: M/S Rahman Traders.</td> </tr> <tr> <td>প্রাক্কলিত মূল্য</td> <td>: ৩,৩৮,০০,০০০.০০ টাকা</td> </tr> <tr> <td>চুক্তিমূল্য</td> <td>: ২,৯৪,৬০,৩১৬.৪২ টাকা</td> </tr> <tr> <td>চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ</td> <td>: ৩০.০১.২০২১ খ্রিঃ</td> </tr> <tr> <td>বর্তমান অগ্রগতি</td> <td>: ৭৫%</td> </tr> </table>	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	: CRMIDP	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	: ২০.০৮.২০১৯ খ্রিঃ	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	: M/S Rahman Traders.	প্রাক্কলিত মূল্য	: ৩,৩৮,০০,০০০.০০ টাকা	চুক্তিমূল্য	: ২,৯৪,৬০,৩১৬.৪২ টাকা	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	: ৩০.০১.২০২১ খ্রিঃ	বর্তমান অগ্রগতি	: ৭৫%	<p><b>Collapsible Gate</b></p> <p><b>Rolling Shutter</b></p> <p><b>Concrete Screed</b></p> <p><b>Signboard &amp; 3D View</b></p>	<p>-</p> <p><b>MS Plate of Side Channel Thickness=6mm width=100mm</b></p> <p><b>38mm Concrete Screed</b></p> <p>-</p>	<p>- Collapsible Gate ফ্লোর লেভেলে থেকে আপ করে সংযোজন করা হয়েছে এবং স্থাপনের পূর্বে Red Oxide ব্যবহার করা হয়নি।</p> <p>- MS Plate of Side Channel Thickness =6.040mm, width= 75mm</p> <p>- ছাদ ঢালায়ের পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ছাদে Concrete Screed করা হয়নি।</p>	<p>- Collapsible Gate ফ্লোর লেভেলে ফ্লাস করে স্থাপন করতে হবে এবং স্থাপনের পূর্বে Red Oxide ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।</p> <p>- Rolling Shutter, Collapsible Gate &amp; MS Grill ইত্যাদি স্থাপনের পূর্বে Red Oxide ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।</p> <p>- স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত Rolling Shutter - এর Channel অপসারণ পূর্বক স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী রোলিং সাটার স্থাপন করতে হবে।</p> <p>- দ্রুত সময়ের মধ্যে ছাদে ভালভাবে চিপিং করে ডিজাইন অনুযায়ী Slope ও Thickness Maintain করে Concrete Screed-এর কাজ শেষ করতে হবে এবং কলাম ও প্যারাপেট ওয়ালের নিচের অংশে Fillet/ঘুঁড়ী করতে হবে।</p> <p>- সাইটে সুবিধাজনক স্থানে সাইনবোর্ড (৩'x৫') এবং ভবনের 3D-View প্রিন্ট করে স্থাপন করতে হবে।</p>
প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	: CRMIDP																				
চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	: ২০.০৮.২০১৯ খ্রিঃ																				
ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	: M/S Rahman Traders.																				
প্রাক্কলিত মূল্য	: ৩,৩৮,০০,০০০.০০ টাকা																				
চুক্তিমূল্য	: ২,৯৪,৬০,৩১৬.৪২ টাকা																				
চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	: ৩০.০১.২০২১ খ্রিঃ																				
বর্তমান অগ্রগতি	: ৭৫%																				

মন্তব্য : স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

  
(শাকিল হাওলাদার)  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

  
(স্বপন কান্তি পাল)  
প্রকল্প পরিচালক





Taluch Hat, under Upazila : Dupchanchia, District : Bogura.



Taluch Hat, under Upazila : Dupchanchia, District : Bogura.



Taluch Hat, under Upazila : Dupchanchia, District : Bogura.



Taluch Hat, under Upazila : Dupchanchia, District : Bogura.




**দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)**  
**পরিদর্শন প্রতিবেদন**

বিভাগ : রাজশাহী      জেলা : বগুড়া      উপজেলা : আদমদিঘী

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্কীমের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা			ত্রুটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা ও মন্তব্য																					
				Item	Design Specification	Field Observation																						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮																					
০৪।	২০/০২/২০২২ খ্রিঃ	বগুড়া/ আদমদিঘী	Construction of 2-Storied Rural Market Building (With 4-Storied Foundation) at <b>Behigram Hat</b> , under Upazila : <b>Adamdighi</b> , District : <b>Bogura</b> .  <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">প্রকল্প/কর্মসূচির নাম</td> <td style="width: 5%;">:</td> <td style="width: 65%;">CRMIDP</td> </tr> <tr> <td>চুক্তি সম্পাদনের তারিখ</td> <td>:</td> <td>০৯.০১.২০১৯ খ্রিঃ</td> </tr> <tr> <td>ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা</td> <td>:</td> <td><b>Don Enterprise &amp; Ethen Enterprise (Pvt.) Limited (Don-EEPL)-JV</b></td> </tr> <tr> <td>প্রাক্কলিত মূল্য</td> <td>:</td> <td>৩,৩৮,০০,০০০.০০ টাকা</td> </tr> <tr> <td>চুক্তিমূল্য</td> <td>:</td> <td>২,৯৪,৭৩,৯৭৪.০০ টাকা</td> </tr> <tr> <td>চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ</td> <td>:</td> <td>০৩.০৭.২০২১ খ্রিঃ</td> </tr> <tr> <td>বর্তমান অগ্রগতি</td> <td>:</td> <td>৯০%</td> </tr> </table>	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	:	CRMIDP	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	:	০৯.০১.২০১৯ খ্রিঃ	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	:	<b>Don Enterprise &amp; Ethen Enterprise (Pvt.) Limited (Don-EEPL)-JV</b>	প্রাক্কলিত মূল্য	:	৩,৩৮,০০,০০০.০০ টাকা	চুক্তিমূল্য	:	২,৯৪,৭৩,৯৭৪.০০ টাকা	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	০৩.০৭.২০২১ খ্রিঃ	বর্তমান অগ্রগতি	:	৯০%	<b>Collapsible Gate</b>  <b>Fancy Screen</b>  <b>Drain</b>	-	- Collapsible Gate ফ্লোর লেভেল থেকে আপ করে সংযোজন করা হয়েছে।  - সিঁড়ি রুমে Fancy Screen (110mmx110mmx110mm) স্থাপন করা হয়েছে।	- Collapsible Gate ফ্লোর লেভেলে ফ্লাস করে স্থাপন করতে হবে এবং স্থাপনের পূর্বে Red Oxide ব্যবহার করতে হবে। - স্পেসিফিকেশন ও ডিজাইন অনুযায়ী Fancy Screen স্থাপন করতে হবে।  - ড্রেনের আউটলেট নির্ধারন করার পর তার সাথে ড্রেনের সংযোগ করে দিতে হবে এবং ড্রেনের স্লোপ সঠিক ভাবে Maintain করতে হবে, যাতে করে পানি সহজে বের হয়ে যেতে পারে।
প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	:	CRMIDP																										
চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	:	০৯.০১.২০১৯ খ্রিঃ																										
ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	:	<b>Don Enterprise &amp; Ethen Enterprise (Pvt.) Limited (Don-EEPL)-JV</b>																										
প্রাক্কলিত মূল্য	:	৩,৩৮,০০,০০০.০০ টাকা																										
চুক্তিমূল্য	:	২,৯৪,৭৩,৯৭৪.০০ টাকা																										
চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	০৩.০৭.২০২১ খ্রিঃ																										
বর্তমান অগ্রগতি	:	৯০%																										

**মন্তব্য :** স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

  
 (শাকিল হাওলাদার)  
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী

  
 (স্বপন কান্তি পাল)  
 প্রকল্প পরিচালক





**Behigram Hat, under Upazila : Adamdighi, District : Bogura.**



**Behigram Hat, under Upazila : Adamdighi, District : Bogura.**



**Behigram Hat, under Upazila : Adamdighi, District : Bogura.**



**Behigram Hat, under Upazila : Adamdighi, District : Bogura.**




**দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)**  
**পরিদর্শন প্রতিবেদন**

বিভাগ : রাজশাহী      জেলা : বগুড়া      উপজেলা : নন্দীগ্রাম

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্কীমের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্কীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা			ত্রুটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা ও মন্তব্য																					
				Item	Design Specification	Field Observation																						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮																					
০৫।	২০/০২/২০২২ খ্রিঃ	বগুড়া/ নন্দীগ্রাম	Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4- Storeyed Foundation) at <b>Hatkaroy Hat</b> , under Upazila : <b>Nandigram</b> , District : <b>Bogura</b> .	<b>Foundation Work</b>	-	- প্রস্তাবিত ভবনের আংশিক অংশে বেজ কাস্টিং এর কাজ শেষ এবং বাকী অংশে বেজ কাস্টিং এর কাজ চলমান আছে।	- কলাম, বীম ও স্লাব-এ স্টীল সাঁটার-এর ব্যবহার নিশ্চিত পূর্বক ঢালাই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। - দ্রুত কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। - সাইটে সুবিধাজনক স্থানে সাইনবোর্ড (৩'x৫') এবং ভবনের 3D-View প্রিন্ট করে স্থাপন করতে হবে।																					
			<table border="0"> <tr> <td>প্রকল্প/কর্মসূচির নাম</td> <td>:</td> <td>CRMIDP</td> </tr> <tr> <td>চুক্তি সম্পাদনের তারিখ</td> <td>:</td> <td>০৩.০৮.২০২১ খ্রিঃ</td> </tr> <tr> <td>ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা</td> <td>:</td> <td><b>M/S. MAHMUDA ENTERPRISE &amp; M/s. DOIEL ENTERPRISE JV</b></td> </tr> <tr> <td>প্রাক্কলিত মূল্য</td> <td>:</td> <td>৩,৫২,০০,০০০.০০ টাকা</td> </tr> <tr> <td>চুক্তিমূল্য</td> <td>:</td> <td>৩,৫৪,২৯,৪৮৬.০০ টাকা</td> </tr> <tr> <td>চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ</td> <td>:</td> <td>১৫.০৯.২০২২ খ্রিঃ</td> </tr> <tr> <td>বর্তমান অগ্রগতি</td> <td>:</td> <td>৩০%</td> </tr> </table>	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	:	CRMIDP	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	:	০৩.০৮.২০২১ খ্রিঃ	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	:	<b>M/S. MAHMUDA ENTERPRISE &amp; M/s. DOIEL ENTERPRISE JV</b>	প্রাক্কলিত মূল্য	:	৩,৫২,০০,০০০.০০ টাকা	চুক্তিমূল্য	:	৩,৫৪,২৯,৪৮৬.০০ টাকা	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	১৫.০৯.২০২২ খ্রিঃ	বর্তমান অগ্রগতি	:	৩০%	<b>Signboard &amp; 3D View</b>	-		
প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	:	CRMIDP																										
চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	:	০৩.০৮.২০২১ খ্রিঃ																										
ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	:	<b>M/S. MAHMUDA ENTERPRISE &amp; M/s. DOIEL ENTERPRISE JV</b>																										
প্রাক্কলিত মূল্য	:	৩,৫২,০০,০০০.০০ টাকা																										
চুক্তিমূল্য	:	৩,৫৪,২৯,৪৮৬.০০ টাকা																										
চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	:	১৫.০৯.২০২২ খ্রিঃ																										
বর্তমান অগ্রগতি	:	৩০%																										

মন্তব্য : স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

  
 (শাকিল হাওলাদার)  
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী

  
 (স্বপন কান্তি পাল)  
 প্রকল্প পরিচালক





**Hatkaroy Hat, under Upazila : Nandigram, District : Bogura.**



**Hatkaroy Hat, under Upazila : Nandigram, District : Bogura.**



**Hatkaroy Hat, under Upazila : Nandigram, District : Bogura.**



**Hatkaroy Hat, under Upazila : Nandigram, District : Bogura.**
