

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭।

[www.lged.gov.bd](http://www.lged.gov.bd)



“শেখ হাসিনার মূলনীতি  
গ্রাম শহরের উন্নতি”

স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৯২২.৯৯.৩৬.২১- ৩৪১০

তারিখ : ০৩/০৪/২০২২ খ্রিঃ

প্রতি,

নির্বাহী প্রকৌশলী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা : শেরপুর।

বিষয় : “দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” - এর প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ৩০/০৩/২০২২ খ্রিঃ তারিখে শেরপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কাজের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : ৪৬.০২.০০০০.৯২২.২৫.০৪.২০২১-৩৭৯৪, তারিখ : ২৭/০৩/২০২২ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ৩০/০৩/২০২২ খ্রিঃ তারিখে শেরপুর জেলার বিভিন্ন উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত ত্রুটিসমূহ প্রকল্প পরিচালক - এর সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধনপূর্বক তার বিস্তারিত সচিত্র প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক বরাবর এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

এখানে উল্লেখ্য যে, Design ও Specification বহির্ভূত কোন কাজের বিল পরিশোধ করা যাবে না। ত্রুটিপূর্ণ কাজের বিল প্রস্তুতকারী ও অনুমোদনকারী ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

বিষয়টি অতীব জরুরী।

  
(স্বপন কান্তি পাল)

প্রকল্প পরিচালক

ফোন : ০২-৪৪৮২৬৩২৮

ইমেইল: [pd.crmidp@lged.gov.bd](mailto:pd.crmidp@lged.gov.bd)

অনুলিপি :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, ময়মনসিংহ বিভাগ, জেলা : ময়মনসিংহ।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, ময়মনসিংহ অঞ্চল, জেলা : ময়মনসিংহ।
- ৫। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলা : সদর/নকলা/নালিতাবাড়ী/ঝিনাইগাতী/শ্রীবর্দী, জেলা : শেরপুর।

**দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)**


**পরিদর্শন প্রতিবেদন**

বিভাগ : ময়মনসিংহ জেলা : শেরপুর উপজেলা : সদর

| ক্রমিক<br>নং | পরিদর্শনের<br>তারিখ | জেলা<br>ও<br>উপজেলা | পরিদর্শনকৃত স্থানের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ,<br>বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)                                                                   | পরিদর্শনকৃত ক্ষীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা |                                                       |                                                                                                                                                                                                                     | ক্রটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ<br>সমাধানের জন্য<br>সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা<br>ও<br>মন্তব্য                                                                                                                                                    |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                     |                     |                                                                                                                                                                           | Item                                                          | Design<br>Specification                               | Field Observation                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |
| ১            | ২                   | ৩                   | ৪                                                                                                                                                                         | ৫                                                             | ৬                                                     | ৭                                                                                                                                                                                                                   | ৮                                                                                                                                                                                                                                          |
| ০১।          | ৩০/০৩/২০২২<br>খ্রিঃ | শেরপুর/<br>সদর      | Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4-Storeyed<br>Foundation) at Bhimgonj Bazar, under Upazila : Sadar, District<br>: Sherpur.                         | Brick Work                                                    | 10 Hole<br>Ceramic<br>Brick Work<br>at Stair<br>Room. | - 10 Hole Ceramic Brick<br>Work এর ফিনিশিং<br>সম্পূর্ণজনক নয়।<br><br>- স্রাবের কানিসে Drip Course<br>সঠিকভাবে করা হয়নি।<br><br>- ১ম তলার বারান্দায় মার্কেটে ভিতরে<br>পানি না ঢুকার জন্য Bit স্থাপন করা<br>হয়নি। | - 10 Hole Ceramic Brick<br>Work - এর ফিনিশিং<br>স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী এবং<br>দৃষ্টিনন্দন ভাবে করতে হবে।<br>- ডিজাইন অনুযায়ী স্রাবের কানিসে<br>Drip Course সঠিকভাবে<br>করতে হবে।<br>- বারান্দায় 10" Wide & 3"<br>Ht. Bit স্থাপন করতে হবে। |
|              |                     |                     | প্রকল্প/কর্মসূচির নাম<br>চুক্তি সম্পাদনের তারিখ<br>ঠিকাদানের নাম ও ঠিকানা<br><br>প্রাক্কলিত মূল্য<br>চুক্তিমূল্য<br>চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ<br>বর্তমান অগ্রগতি | Drip<br>Course                                                | -                                                     | - Roof Top - এ পানির পাইপ লাইন<br>সঠিকভাবে স্থাপন করা হয়নি।                                                                                                                                                        | - ডিজাইন অনুযায়ী Roof Top -<br>পানির পাইপ লাইন সঠিকভাবে<br>স্থাপন করতে হবে।                                                                                                                                                               |
|              |                     |                     | CRMIDP<br>% ০৯.১২.২০১৯ খ্রিঃ<br>M/S Akram Enterprise,<br>Khoarpar, Sherpur.<br>% ২,৮৬,০০,০০০.০০ টাকা<br>% ২,৫৬,৯৬,৪৪০.৯১ টাকা<br>% ২৮.০২.২০২২ খ্রিঃ<br>% ৮৫ %             | Bit for<br>Water<br>Protection<br>at<br>Bharandha             | -                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |
|              |                     |                     |                                                                                                                                                                           | Water<br>Supply Line<br>at Roof Top                           | -                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                            |

**বিশেষ মন্তব্য :**


- চুক্তি সম্পাদনের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় এবং সময় বর্ধনের বিষয়েও কোন উদ্বেগ গ্রহণ করা হয়নি। এতে প্রতিরূপ হলে, Contract Management এবং Time Management এর বিষয়ে প্রকল্পের কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। এ বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। অন্যথায় পরবর্তীতে সৃষ্ট যে কোন জটিলতার জন্য প্রকল্পের অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী দায়ী থাকবেন।
- স্পেসিফিকেশন ও সিটিউনে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

  
 (শাফিকুল হাওলাদার)  
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী

  
 (স্বপন কান্তি পাল)  
 প্রকল্প পরিচালক



**Bhimgonj Bazar, under Upazila : Sadar, District : Sherpur.**

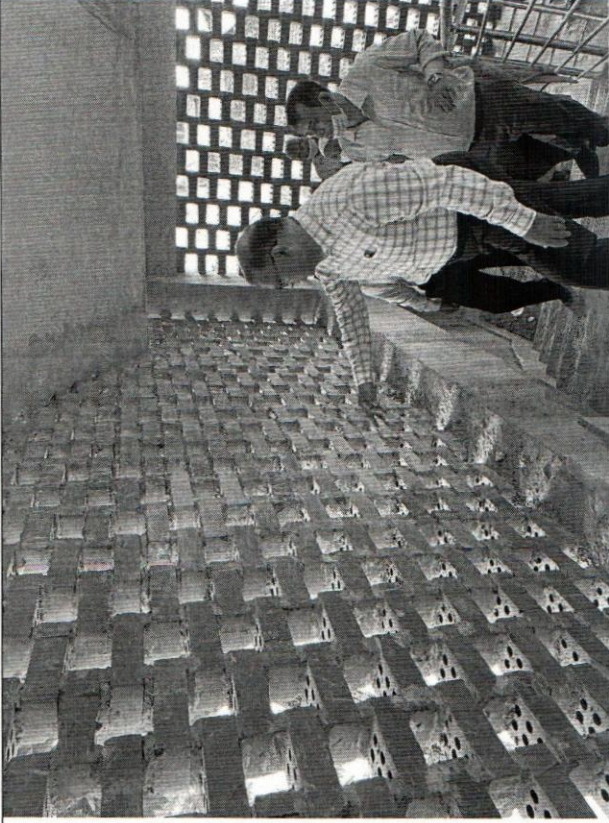

**Bhimgonj Bazar, under Upazila : Sadar, District : Sherpur.**



**Bhimgonj Bazar, under Upazila : Sadar, District : Sherpur.**



**Bhimgonj Bazar, under Upazila : Sadar, District : Sherpur.**

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)**


**পরিদর্শন প্রতিবেদন**

বিভাগ : ময়মনসিংহ জেলা : শেরপুর উপজেলা : নকলা


| ক্রমিক<br>নং | পরিদর্শনের<br>তারিখ | জেলা<br>ও<br>উপজেলা | পরিদর্শনকৃত স্থানের বিবরণ (সমাঙ্গির জন্য নির্ধারিত তারিখ,<br>বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | পরিদর্শনকৃত স্থানসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ত্রুটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ<br>সমাধানের জন্য<br>সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা<br>ও<br>মন্তব্য                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Item                                                          | Design<br>Specification                                                                                                       | Field Observation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ১            | ২                   | ৩                   | ৪                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ৫                                                             | ৬                                                                                                                             | ৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ০২।          | ৩০/০৩/২০২২<br>খ্রিঃ | শেরপুর/<br>নকলা     | Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4-Storeyed<br>Foundation) at Baussha Bazar, under Upazila : Nakla, District :<br>Sherpur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Brick Work                                                    | 10 Hole Ceramic<br>Brick Work at<br>Barandha                                                                                  | - 10 Hole Ceramic Brick<br>Work এর Workmanship<br>সন্তোষজনক নয়।<br><br>- শ্রাবের কার্নিসে Drip Course<br>সঠিকভাবে করা হয়নি।<br><br>- গ্রাউন্ড ফ্লোর-এ প্লাটফর্মের এর<br>ড্রেন ডিজাইন অনুযায়ী করা<br>হয়নি।<br><br>- MS Plate of side<br>Channel<br>Thickness=5.41mm<br>width=100mm<br>- MS Plate of Mid<br>Channel<br>Thickness=5.41mm<br>width=150mm | - 10 Hole Ceramic Brick<br>Work - এর ফিনিশিং<br>স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী এবং<br>দৃষ্টিনন্দন ভাবে করতে হবে।<br>- ডিজাইন অনুযায়ী শ্রাবের কার্নিসে<br>Drip Course সঠিকভাবে<br>করতে হবে।<br>- স্পেসিফিকেশন ও ডিজাইন<br>অনুযায়ী প্লাটফর্ম এর ড্রেন এবং<br>ড্রেনের পিট কভার স্থাপন করতে<br>হবে।<br>- স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী রোলিং<br>সাঁটার স্থাপন করতে হবে। |
|              |                     |                     | <div> <div>প্রকল্প/কর্মসূচির নাম</div> <div>চুক্তি সম্পাদনের তারিখ</div> <div>ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা</div> <div>প্রাকল্পিত মূল্য</div> <div>চুক্তিমূল্য</div> <div>চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ</div> <div>বর্তমান অগ্রগতি</div> </div> <div> <div>CRMIDP</div> <div>০৯.১২.২০১৯ খ্রিঃ</div> <div>M/S Akram Enterprise,<br/>Khaarpar, Sherpur.</div> <div>২,৩১,০০,০০০.০০ টাকা</div> <div>২,১২,২৫,৪৯২.১৫ টাকা</div> <div>২৮.০২.২০২২ খ্রিঃ</div> <div>৯৫ %</div> </div> | Drip<br>Course                                                |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Drain at<br>Platform                                          |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rolling<br>Shutter                                            | - MS Plate of<br>side Channel<br>Thickness=6mm<br>width=100mm<br>- MS Plate of<br>Mid Channel<br>Thickness=6mm<br>width=150mm |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

বিশেষ মন্তব্য :

- চুক্তি সম্পাদনের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় এবং সময় বর্ধনের বিষয়েও কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এতে প্রতিময়মান হচ্ছে, Contract Management এবং Time Management এর বিষয়ে ক্রমকারী কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এ বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। অন্যথায় পরবর্তীতে স্ট্রট্ট যে কোন জটিলতার জন্য ক্রমকারী অথবা সংশ্লিষ্ট নিবাহী প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী দায়ী থাকবেন।
- স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

  
 (শাকিল হোসেন)  
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী


  
 (শাকিল হোসেন)  
 প্রকল্প পরিচালক

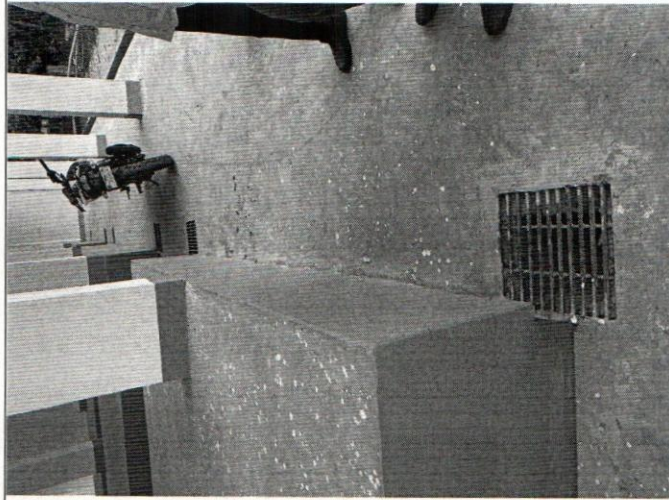

**Bausha Bazar, under Upazila : Nakla, District : Sherpur.**



**Bausha Bazar, under Upazila : Nakla, District : Sherpur.**

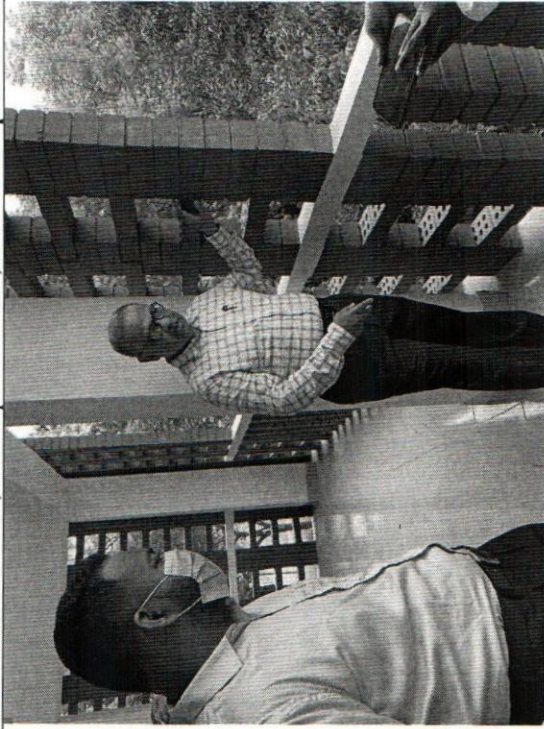

**Bausha Bazar, under Upazila : Nakla, District : Sherpur.**



**Bausha Bazar, under Upazila : Nakla, District : Sherpur.**

*Ram*

*Ram*

**দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)**

**পরিদর্শন প্রতিবেদন**

বিভাগ : ময়মনসিংহ জেলা : শেরপুর উপজেলা : নালিতাবাড়ী

| ক্রমিক<br>নং | পরিদর্শনের<br>তারিখ | জেলা<br>ও<br>উপজেলা    | পরিদর্শনকৃত স্থানের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ,<br>বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)                                                               | পরিদর্শনকৃত স্থানসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা                                                 |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ত্রুটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ<br>সমাধানের জন্য<br>সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থাদি<br>ও<br>মন্তব্য                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                     |                        |                                                                                                                                                                       | Item                                                                                                          | Design<br>Specification                                   | Field Observation                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ১            | ২                   | ৩                      | ৪                                                                                                                                                                     | ৫                                                                                                             | ৬                                                         | ৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ০৩।          | ৩০/৩/২০২২<br>খ্রিঃ  | শেরপুর/<br>নালিতাবাড়ী | Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4-Storeyed<br>Foundation) at Ghagpara Bazar, under Upazila : Nalitabari,<br>District : Sherpur.                | Brick Work                                                                                                    | 10 Hole Ceramic<br>Brick Work at<br>Barandha              | - 10 Hole Ceramic Brick<br>Work এর ফিনিশিং<br>স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী এবং<br>দৃষ্টিনন্দন ভাবে করতে হবে।<br>- ১ম তলার Void এর পার্শ্বের<br>ব্রীক ওয়াল আকা-বাঁকা হয়েছে।<br>- ড্রইং ও ডিজাইন অনুযায়ী Stair<br>landing সঠিকভাবে স্থাপন<br>করা হয়নি।<br>- দ্রাবের কানিসে Drip Course<br>সঠিকভাবে করা হয়নি। | - 10 Hole Ceramic Brick<br>Work - এর ফিনিশিং<br>স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী এবং<br>দৃষ্টিনন্দন ভাবে করতে হবে।<br>- ১ম তলার Void এর পার্শ্বের<br>ব্রীক ওয়াল এর আকা-বাঁকা ঠিক<br>করতে হবে।<br>- ড্রইং ও ডিজাইন অনুযায়ী Stair<br>landing সঠিকভাবে স্থাপন<br>করতে হবে।<br>- ডিজাইন অনুযায়ী দ্রাবের কানিসে<br>Drip Course সঠিকভাবে<br>করতে হবে।<br>- স্পেসিফিকেশন ও ডিজাইন<br>অনুযায়ী প্লাটফর্ম এর ড্রেন এবং<br>ড্রেনের পিট কভার স্থাপন<br>করতে হবে।<br>- Collapsible Gate ফ্লোর<br>লেভেলে ফ্লাস করে স্থাপন করতে<br>হবে।<br>- Roof Top-এ শর্ট কলামের<br>উচ্চতা ৩'-০" করতে হবে। |
|              |                     |                        | প্রকল্প/কর্মসূচির নাম<br>চুক্তি সম্পাদনের তারিখ<br>ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা<br>প্রাক্কলিত মূল্য<br>চুক্তিমূল্য<br>চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ<br>বর্তমান অগ্রগতি | Stair<br>landing<br><br>Drip<br>Course<br><br>Drain at<br>Platform<br><br>Collapsible<br>Gate<br><br>Roof Top | -<br><br><br><br><br><br>38mm<br>Concrete Screed<br><br>- | -<br><br><br><br><br><br>Collapsible Gate ফ্লোর<br>লেভেলে থেকে আপ করে<br>সংযোজন করা হয়েছে।<br>- Roof Top-এ শর্ট কলামের<br>উচ্চতা কম-বেশী আছে।                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |





| ক্রমিক<br>নং | পরিদর্শনের<br>তারিখ | জেলা<br>ও<br>উপজেলা | পরিদর্শনকৃত ক্ষীরের বিবরণ (সমাঙ্গির জন্য নির্ধারিত তারিখ,<br>বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ) | পরিদর্শনকৃত ক্ষীরসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ক্রটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ<br>সমাধানের জন্য<br>সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা<br>ও<br>মন্তব্য                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                     |                     |                                                                                                         | Item                                                                                                                                                                                   | Design<br>Specification | Field Observation                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ১            | ২                   | ৩                   | ৪                                                                                                       | ৫                                                                                                                                                                                      | ৬                       | ৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                     |                     |                                                                                                         | Steel Door<br>at Roof Top<br><br>2 coats over<br>a coat of<br>priming<br>coat of<br>water sealer<br>and ready<br>mixed wall<br>putty of<br>approved<br>brand<br><br>Concrete<br>Screed | -<br><br>-<br><br>-     | - Roof Top-এ Steel Door<br>ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন<br>অনুযায়ী লাগানো হয়নি।<br>- রং করার পূর্বে প্লাস্টার<br>ভালেভাবে ঘষা হয়নি এবং<br>অধিকাংশ ক্ষেত্রে সিলার ও পণ্ডি<br>ব্যবহার করা হয়নি।<br><br>- Roof Top - এ Concrete<br>Screed সঠিকভাবে না করায়<br>কিছু কিছু জায়গায় Concrete<br>Screed উঠে গেছে। | - Roof Top-এ Steel Door<br>ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন<br>অনুযায়ী স্থাপন করতে হবে।<br>- স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী রং এর<br>কাজ করতে হবে।<br><br>- ত্রুটিপূর্ণ Concrete Screed<br>অপসারণ পূর্বক ডিজাইন ও<br>স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী<br>Concrete Screed স্থাপন<br>করতে হবে এবং গ্রোপ<br>সঠিকভাবে করতে হবে যাতে<br>ছাদে পানি না জমে। |

বিশেষ মন্তব্য :

- চুক্তি সম্পাদনের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় এবং সময় বর্ধনের বিষয়েও কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এতে প্রতিযমান হচ্ছে, Contract Management এবং Time Managment এর বিষয়ে ক্রমকারী কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এ বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। অন্যথায় পরবর্তীতে স্ট্র যে কোন জটিলতার জন্য ক্রমকারী অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট নিবাহী প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী দায়ী থাকবেন।
- স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

১০/০৮/২০২১  
(শাকিল হাজাদার)  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী


১০/০৮/২০২২  
(সপন কান্তি পাল)  
প্রকল্প পরিচালক



**Ghagpara Bazar, under Upazila : Nalitabari, District : Sherpur.**



**Ghagpara Bazar, under Upazila : Nalitabari, District : Sherpur.**

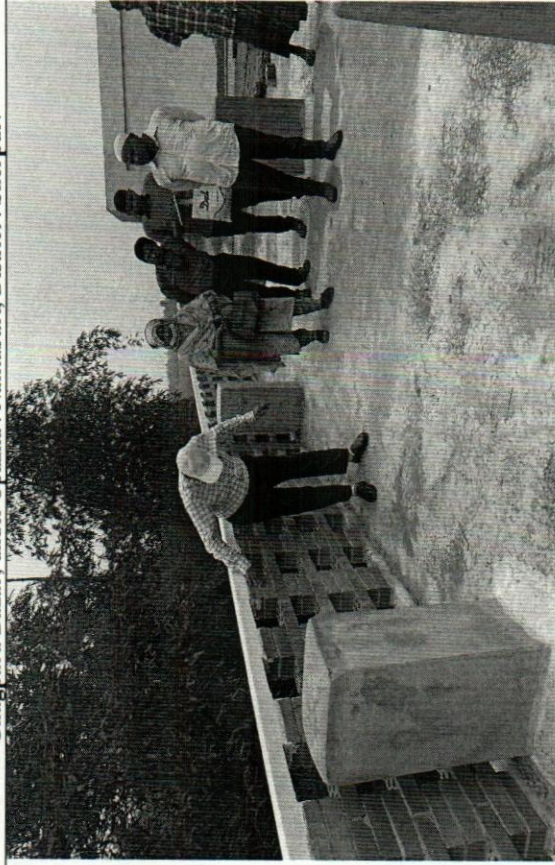

**Ghagpara Bazar, under Upazila : Nalitabari, District : Sherpur.**



**Ghagpara Bazar, under Upazila : Nalitabari, District : Sherpur.**

*Amr*

*Amr*

**দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)**


**পরিদর্শন প্রতিবেদন**

বিভাগ : ময়মনসিংহ জেলা : শেরপুর উপজেলা : ঝিনাইগাতী

| ক্রমিক<br>নং | পরিদর্শনের<br>তারিখ | জেলা<br>ও<br>উপজেলা  | পরিদর্শনকৃত স্থানের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ,<br>বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)                                               | পরিদর্শনকৃত ক্ষীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা |                                              |                                                                                                                                                  | ক্রটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ<br>সমাধানের জন্য<br>সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা<br>ও<br>মন্তব্য                                                                                                   |
|--------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                     |                      |                                                                                                                                                       | Item                                                          | Design<br>Specification                      | Field Observation                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |
| ১            | ২                   | ৩                    | ৪                                                                                                                                                     | ৫                                                             | ৬                                            | ৭                                                                                                                                                | ৮                                                                                                                                                                                         |
| ০৪।          | ৩০/৩/২০২২<br>খ্রিঃ  | শেরপুর/<br>ঝিনাইগাতী | Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4-Storeyed<br>Foundation) at Paikura Bazar, under Upazila : Jhenaigati,<br>District : Sherpur. | Brick Work                                                    | 10 Hole Ceramic<br>Brick Work at<br>Barandha | - 10 Hole Ceramic Brick<br>Work এর ফিনিশিং<br>সম্প্রসারণকৃত নয়।<br><br>- গ্রাউন্ড ফ্লোর-এ প্লাটফর্মের এর<br>ড্রেন ডিজাইন অনুযায়ী করা<br>হয়নি। | - 10 Hole Ceramic Brick<br>Work - এর ফিনিশিং<br>সম্প্রসারণকৃত নয়।<br><br>- ড্রেন ডিজাইন ও প্লাটফর্মের<br>অনুযায়ী গ্রাউন্ড ফ্লোর-এ<br>প্লাটফর্মের উচ্চতা এবং ড্রেন<br>সঠিকভাবে করতে হবে। |

বিশেষ মন্তব্য :

- চুক্তি সম্পাদনের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় এবং সময় বর্ণনের বিষয়েও কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এতে প্রতিরোধন হচ্ছে, Contract Management এবং Time Managment এর বিষয়ে ক্রমকারী কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এ বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। অন্যথায় পরবর্তীতে স্ট্র যে কোন জটিলতার জন্য ক্রমকারী অথবা সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী দায়ী থাকবেন।
- স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

  
(শাকিল হোসেন)  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

  
(শ্বপন কান্তি পাল)  
প্রকল্প পরিচালক




**Paikura Bazar, under Upazila : Jhenaigati, District : Sherpur.**



**Paikura Bazar, under Upazila : Jhenaigati, District : Sherpur.**



**Paikura Bazar, under Upazila : Jhenaigati, District : Sherpur.**

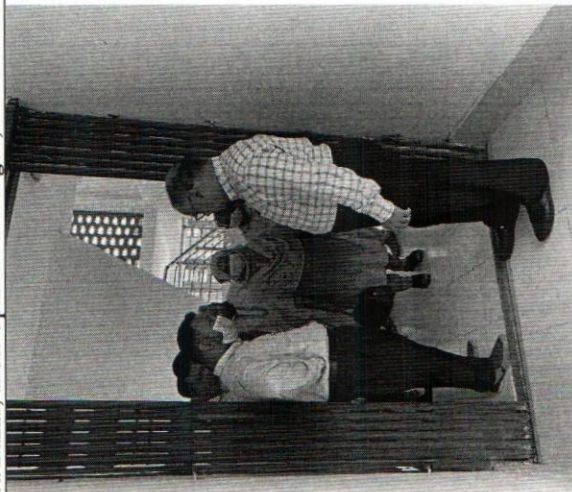

**Paikura Bazar, under Upazila : Jhenaigati, District : Sherpur.**

*Signature*

*Signature*

**দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)**


**পরিদর্শন প্রতিবেদন**

বিভাগ : ময়মনসিংহ জেলা : শেরপুর উপজেলা : হ্রীবদী

| ক্রমিক<br>নং | পরিদর্শনের<br>তারিখ | জেলা<br>ও<br>উপজেলা | পরিদর্শনকৃত স্থানের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ,<br>বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)                                            | পরিদর্শনকৃত স্থানসমূহের পরিলক্ষিত ক্রটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা |                         |                                                                                                                     | ক্রটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ<br>সমাধানের জন্য<br>সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা<br>ও<br>মন্তব্য                                                                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                     |                     |                                                                                                                                                    | Item                                                         | Design<br>Specification | Field Observation                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ১            | ২                   | ৩                   | ৪                                                                                                                                                  | ৫                                                            | ৬                       | ৭                                                                                                                   | ৮                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ০৫।          | ৩০/৩/২০২২<br>খ্রিঃ  | শেরপুর/<br>হ্রীবদী  | Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4-Storeyed<br>Foundation) at Kurua Bazar, under Upazila : Sreebordi, District<br>: Sherpur. | Foundation<br>&<br>Ground<br>Floor                           | -                       | - Grade Beam পর্যন্ত কাজ<br>শেষ।<br>- ১ম তলার কলামের জন্য রড<br>মজুদ করা হয়েছে এবং<br>Fabrication এর কাজ<br>চলমান। | - কলাম, বীম ও শ্রাব-এ স্টীল<br>সাঁটর-এর ব্যবহার নিশ্চিত<br>পূর্বক ঢালাই কাজ সম্পন্ন করতে<br>হবে।<br>- দ্রুত কাজ বাস্তবায়নের<br>প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে<br>হবে।<br>- সাইটে সুবিধাজনক স্থানে<br>সাইনবোর্ড (৩'x৫') এবং<br>ভবনের 3D-View প্রিন্ট করে<br>স্থাপন করতে হবে। |

স্বাক্ষরিত ০৬/০৪/২০২২  
(শাকিল হাজিদার)  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী

স্বাক্ষরিত ০৬/০৪/২০২২  
(স্বপন কান্তি পাল)  
প্রকল্প পরিচালক

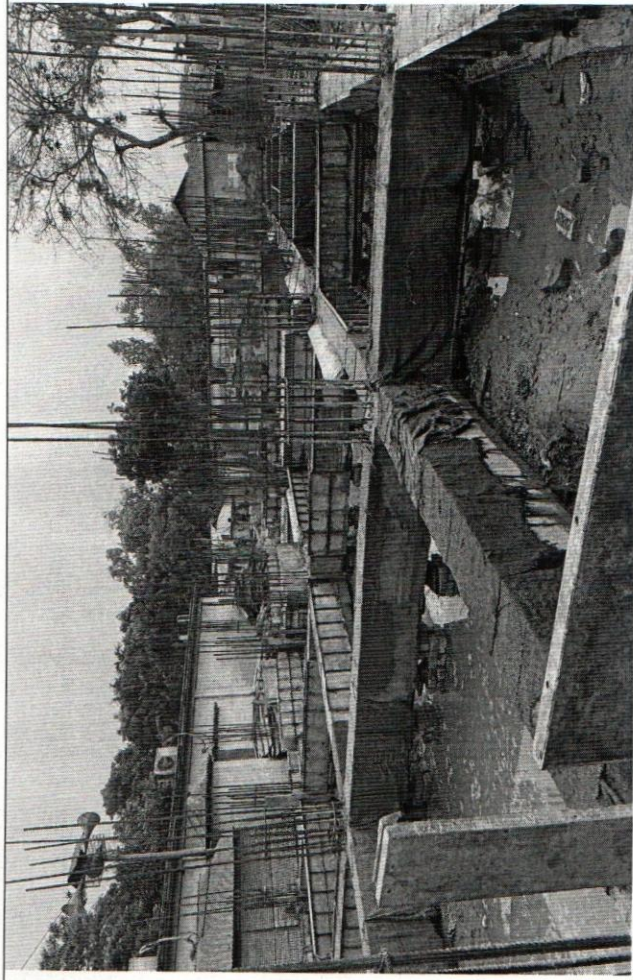


**Kurua Bazar, under Upazila : Sreebordi, District : Sherpur.**



**Kurua Bazar, under Upazila : Sreebordi, District : Sherpur.**



**Kurua Bazar, under Upazila : Sreebordi, District : Sherpur.**

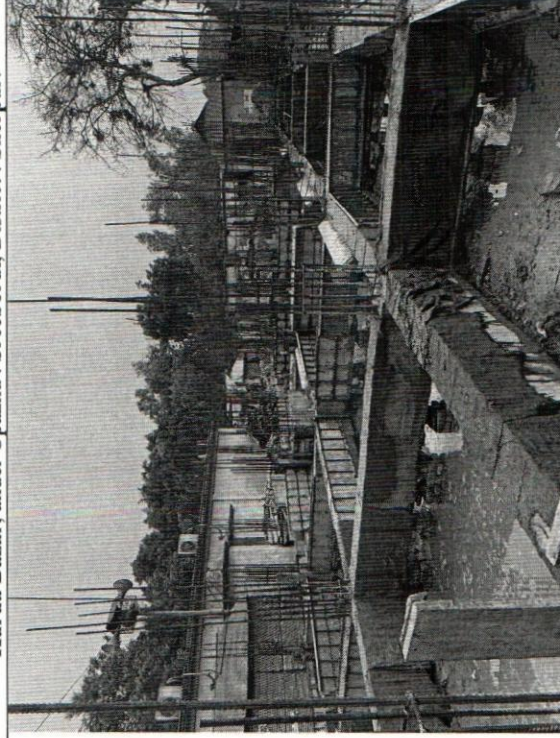

**Kurua Bazar, under Upazila : Sreebordi, District : Sherpur.**

*Ram*

*Ram*
