

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর

ঢাকা-১২০৭।

www.lged.gov.bd



“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৯২২.৯৯.৩৬.২১- ০৪৯৪

তারিখ : ০৩/০৪/২০২২ খ্রিঃ

প্রতি,

নিবাহী প্রকৌশলী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

জেলা : ময়মনসিংহ।

বিষয় : “দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” - এর প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ২৮/০৩/২০২২ খ্রিঃ হতে ২৯/০৩/২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কাজের পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : ৪৬.০২.০০০০.৯২২.২৫.০৪.২০২১-৩৭৯৪, তারিখ : ২৭/০৩/২০২২ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক ২৮/০৩/২০২২ খ্রিঃ হতে ২৯/০৩/২০২২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন উপজেলায় চলমান মার্কেট ভবন নির্মাণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। উক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত ত্রুটিসমূহ প্রকল্প পরিচালক - এর সুপারিশ অনুযায়ী সংশোধনপূর্বক তার বিস্তারিত সচিত্র প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক বরাবর এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

এখানে উল্লেখ্য যে, Design ও Specification বহির্ভূত কোন কাজের বিল পরিশোধ করা যাবে না। ত্রুটিপূর্ণ কাজের বিল প্রস্তুতকারী ও অনুমোদনকারী ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।

বিষয়টি অতীব জরুরী।


(স্বপন কান্তি পাল)
প্রকল্প পরিচালক

ফোন : ০২-৪৪৮২৬৩২৮

ইমেইল: pd.crmidp@lged.gov.bd


০৩/০৪/২২

অনুলিপি :

- ১। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ২। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, ময়মনসিংহ বিভাগ, জেলা : ময়মনসিংহ।
- ৩। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মনিটরিং ও মূল্যায়ন শাখা, এলজিইডি, সদর দপ্তর, ঢাকা-১২০৭।
- ৪। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, এলজিইডি, ময়মনসিংহ অঞ্চল, জেলা : ময়মনসিংহ।
- ৫। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলা : ভালুকা/ফুলবাড়িয়া/তারাকান্দা/ফুলপুর/হালুয়াঘাট, জেলা : ময়মনসিংহ।

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)


পরিদর্শন প্রতিবেদন

বিভাগ : ময়মনসিংহ জেলা : ময়মনসিংহ উপজেলা : ভালুকা

পরিদর্শনের তারিখ : ২৮/০৩/২০২২ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্থানের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্থানসমূহের পরিলক্ষিত ক্রটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা		ক্রটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা/মন্তব্য
				Item	Design Specification	
১	২৮/০৩/২০২২ খ্রিঃ	ময়মনসিংহ / ভালুকা	<p align="center">৪</p> <p>Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4-Storeyed Foundation) at Mahmudpur Bazar, under Upzila : Bhaluka, District : Mymensingh.</p> <p>প্রকল্প/কর্মসূচির নাম : CRMIDP চুক্তি সম্পাদনের তারিখ : ২৭.০৯.২০২০ খ্রিঃ ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা : Maliha Trade International Uttara, Dhaka. প্রাক্কলিত মূল্য : ১,৮৪,০০,০০০.০০টাকা চুক্তিমূল্য : ১,৬৫,৬০,৪৫.৮০ টাকা চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ : ৩১.০৮.২০২২ খ্রিঃ বর্তমান অগ্রগতি : ৮০%</p>	৬	৭	<p align="center">৮</p> <p>- ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাউন্ড ফ্লোর-এ প্রাটফর্মের উচ্চতা এবং ড্রেন সঠিকভাবে করতে হবে। - দ্রুত সময়ের মধ্যে ছাদে ভালভাবে চিপিং করে ডিজাইন অনুযায়ী Slope ও Maintain Thickness করে Concrete Screed-এর কাজ শেষ করতে হবে এবং কলাম ও প্যারাপেট ওয়ালের নিচের অংশে Fillet/খুজী করতে হবে।</p>


মন্তব্য : স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।


 (শাকিল হোসেন)
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী


 (শপন কান্তি পাল)
 প্রকল্প পরিচালক



Mahmudpur Bazar, under Upzila : Bhaluka, District : Mymensingh.

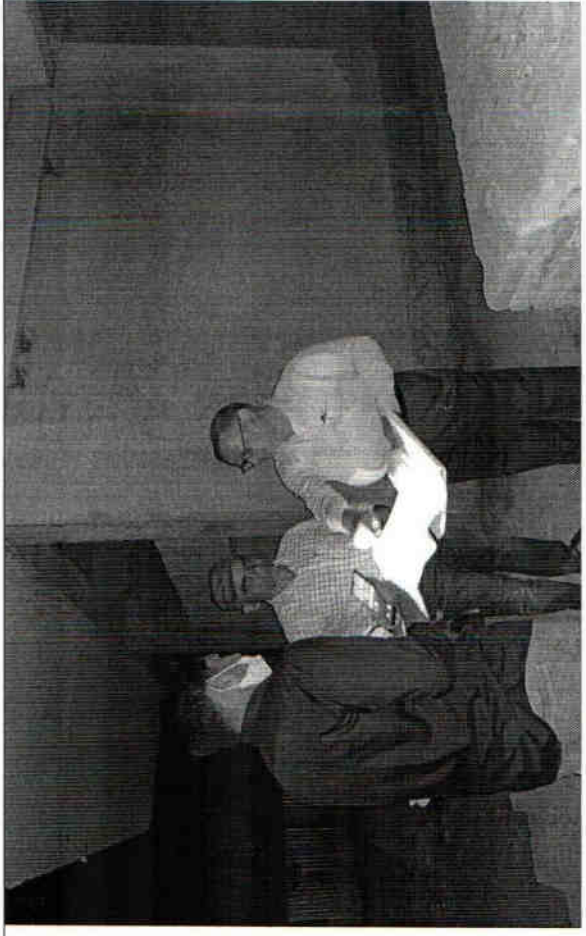

Mahmudpur Bazar, under Upzila : Bhaluka, District : Mymensingh.



Mahmudpur Bazar, under Upzila : Bhaluka, District : Mymensingh.



Mahmudpur Bazar, under Upzila : Bhaluka, District : Mymensingh.

Amr

Amr

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)


পরিদর্শন প্রতিবেদন

উপজেলা : ফুলবাড়িয়া


বিভাগ : ময়মনসিংহ জেলা : ময়মনসিংহ

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্থানের বিবরণ (সমাঙ্গির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্থানসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা			ক্রটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা ও মন্তব্য
				Item	Design Specification	Field Observation	
০২।	২৯/৩/২০২২ খ্রিঃ	ময়মনসিংহ/ ফুলবাড়িয়া	৪ Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4-Storeyed Foundation) at Achim Bazar, under Upzila : Fulbaria, District : Mymensingh. প্রকল্প/কর্মসূচির নাম চুক্তি সম্পাদনের তারিখ ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা প্রাকল্পিত মূল্য চুক্তিমূল্য চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাঙ্গির তারিখ বর্তমান অগ্রগতি	৬ 10 Hole Ceramic Brick Work at Barandha.	৭ - 10 Hole Ceramic Brick Work এর Workmanship সন্তোষজনক নয়। - বারান্দার RCC Post এর ফিনিশিং দৃষ্টিনন্দন ভাবে করা হয়নি। - গ্রাউন্ড ফ্লোর-এ প্রাটফর্মের এর ড্রেন ডিজাইন অনুযায়ী করা হয়নি।	৮ - 10 Hole Ceramic Brick Work - এর ফিনিশিং স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী এবং দৃষ্টিনন্দন ভাবে করতে হবে। - বারান্দার RCC Post এর ফিনিশিং দৃষ্টিনন্দন ভাবে করতে হবে। - ডিজাইন স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রাউন্ড ফ্লোর-এ প্রাটফর্মের উচ্চতা এবং ড্রেন সঠিকভাবে করতে হবে।	


মন্তব্য : স্পেসিফিকেশন ও সিডিউলে উল্লেখিত ব্র্যান্ড অনুযায়ী বৈদ্যুতিক মালামাল ও সোলার সিস্টেম স্থাপন নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।


 (শাকিল হাঞ্জলাদার)
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী


 (শ্বপন কান্তি পাল)
 প্রকল্প পরিচালক

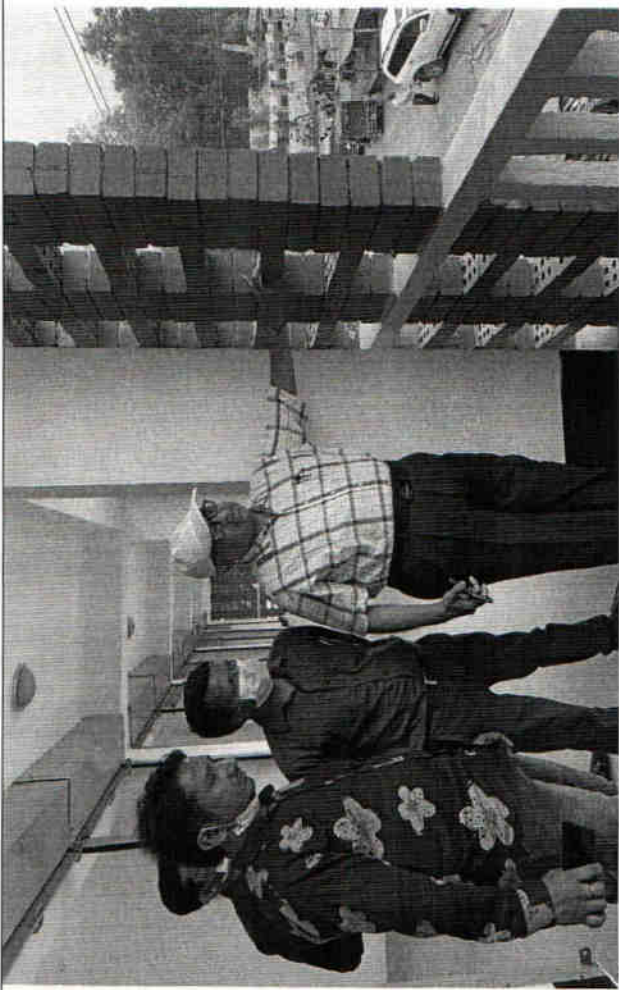


Achim Bazar, under Upzila : Fulbaria, District : Mymensingh.

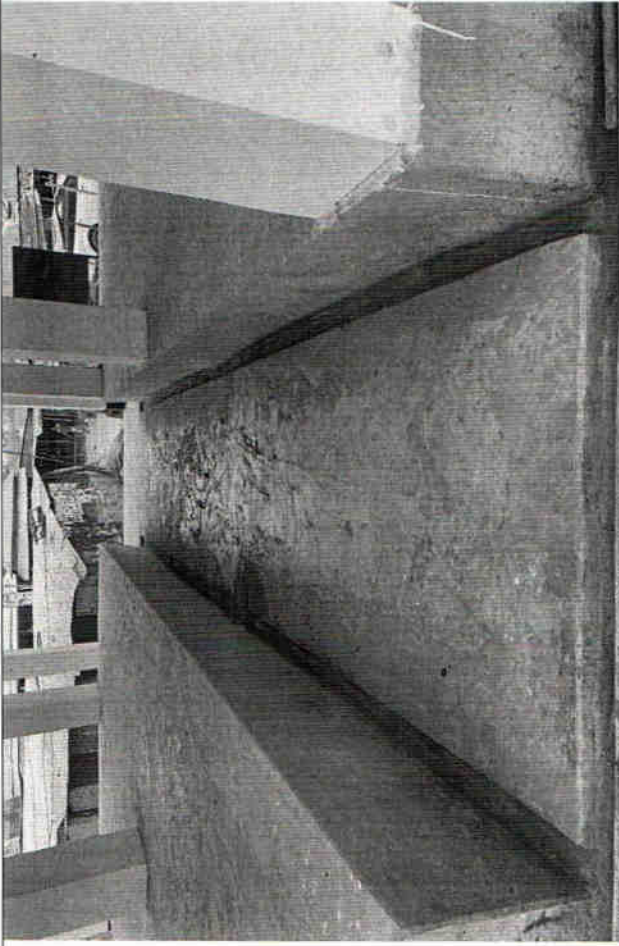

Achim Bazar, under Upzila : Fulbaria, District : Mymensingh.



Achim Bazar, under Upzila : Fulbaria, District : Mymensingh.

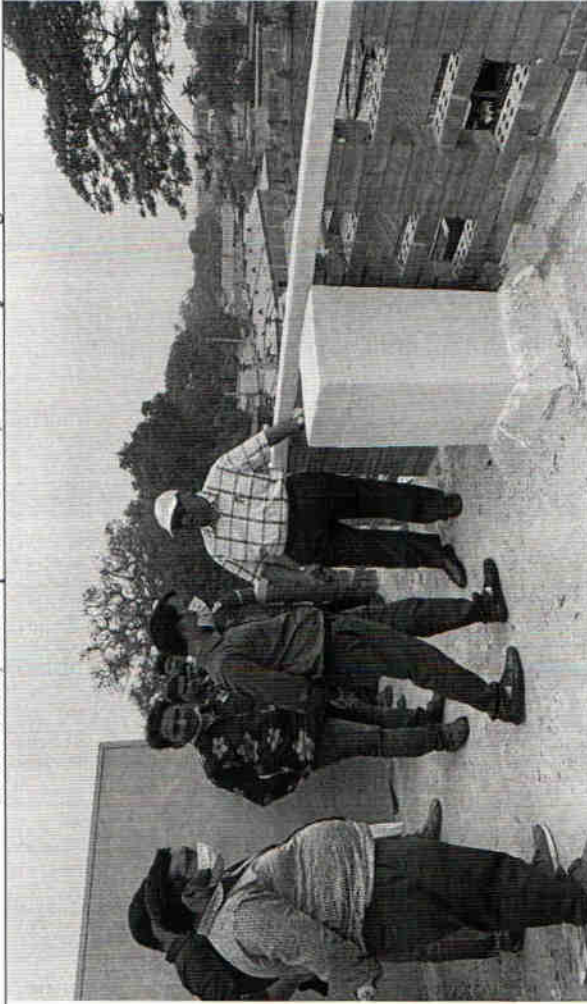

Achim Bazar, under Upzila : Fulbaria, District : Mymensingh.

Handwritten signature

Handwritten signature


দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

পরিদর্শন প্রতিবেদন

উপজেলা : ফুলবাড়িয়া

বিভাগ : ময়মনসিংহ জেলা : ময়মনসিংহ


ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত ক্ষীমের বিবরণ (সমাঙ্গির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত ক্ষীমসমূহের পরিলক্ষিত ত্রুটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা		ক্রটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থা ও মন্তব্য
				Item	Design Specification	
০২।	২৯/৩/২০২২ খ্রিঃ	ময়মনসিংহ/ ফুলবাড়িয়া	৪ Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4-Storeyed Foundation) at Babugonj Bazar, under Upzila : Fulbaria, District : Mymensingh. প্রকল্প/কর্মসূচির নাম চুক্তি সম্পাদনের তারিখ ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা প্রাকল্পিত মূল্য চুক্তিমূল্য চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাঙ্গির তারিখ বর্তমান অগ্রগতি	৬ -	৭ - প্রি-কাস্ট পাইল ড্রাইভিং শেষ। - ফাউন্ডেশনের মাটি কাটার কাজ চলমান।	b - কলাম, বীম ও ট্রাব-এ স্টীল সাটার-এর ব্যবহার নিশ্চিত পূর্বক টালাই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। - দ্রুত কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। - সাইটে সুবিধাজনক স্থানে সাইনবোর্ড (৩'x৫') এবং ভবনের 3D-View প্রিন্ট করে স্থাপন করতে হবে।
			CRMIDP ১৪.০৩.২০২১ খ্রিঃ M/S. Surma Engineering works Bhaluka, Mymensingh ৩,১০,০০,০০০.০০টাকা ২,৬২,৬৬,০৭৫.৪০ টাকা ৩১.০৫.২০২২ খ্রিঃ ২৫%			


 (শাকিল হাঙ্গলাদার)
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী


 (প্রদ্যোত পাঁল)
 প্রকল্প পরিচালক



Babugonj Bazar, under Upzila : Fulbaria, District : Mymensingh.

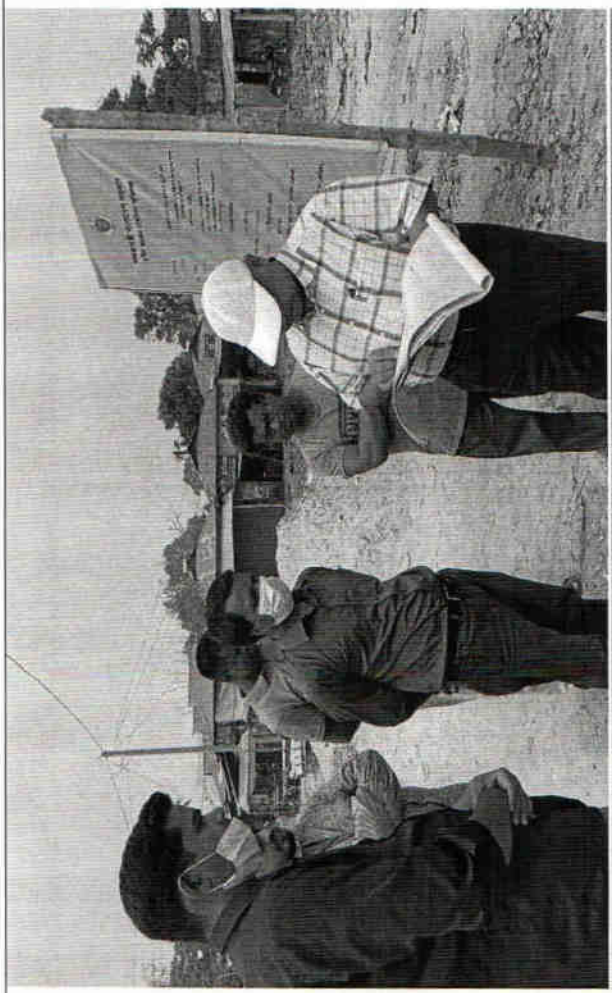

Babugonj Bazar, under Upzila : Fulbaria, District : Mymensingh.



Babugonj Bazar, under Upzila : Fulbaria, District : Mymensingh.



Babugonj Bazar, under Upzila : Fulbaria, District : Mymensingh.

Ram

Ram

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

পরিদর্শন প্রতিবেদন


উপজেলা : তারাকান্দা

বিভাগ : ময়মনসিংহ জেলা : ময়মনসিংহ


ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত ক্ষীমের বিবরণ (সমাঙ্গির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত ক্ষীমসমূহের পরিলক্ষিত ক্রটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা																
				Item	Design Specification	Field Observation														
০২।	২৯/৩/২০২২ খ্রিঃ	ময়মনসিংহ/ তারাকান্দা	<p align="center">৪</p> <p>Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4-Storeyed Foundation) at Tarakanda Dokkhin Bazar, under Upzila : Tarakanda, District : Mymensingh.</p> <table border="1"> <tr> <td>প্রকল্প/কর্মসূচির নাম</td> <td>CRMIDP</td> </tr> <tr> <td>চুক্তি সম্পাদনের তারিখ</td> <td>০৪.১১.২০১৯ খ্রিঃ</td> </tr> <tr> <td>ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা</td> <td>SE & EET (JV) Baghmara, Sadar, Mymensingh.</td> </tr> <tr> <td>প্রাক্কলিত মূল্য</td> <td>১,৮৮,০০,০০০.০০ টাকা</td> </tr> <tr> <td>চুক্তিমূল্য</td> <td>১,৭৪,৩৮,৯১৩.৬৫ টাকা</td> </tr> <tr> <td>চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাঙ্গির তারিখ</td> <td>৩০.১১.২০২০ খ্রিঃ</td> </tr> <tr> <td>বর্তমান অগ্রগতি</td> <td>৬০%</td> </tr> </table>	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	CRMIDP	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	০৪.১১.২০১৯ খ্রিঃ	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	SE & EET (JV) Baghmara, Sadar, Mymensingh.	প্রাক্কলিত মূল্য	১,৮৮,০০,০০০.০০ টাকা	চুক্তিমূল্য	১,৭৪,৩৮,৯১৩.৬৫ টাকা	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাঙ্গির তারিখ	৩০.১১.২০২০ খ্রিঃ	বর্তমান অগ্রগতি	৬০%	<p align="center">৫</p> <p>Shuttering Work for 2nd Slab</p>	<p align="center">৬</p> <p>(Shuttering with Plain 16 BWG Steel Sheet fitted Over 38mm×38mm×5mm in MS angle and 25mm×25mm×5mm in FI bar frame and 38mm/50mm Steel or GI pipe Props suitably braced and 12 BWG Steel Sheet plate box of proper size Where required.)</p>	<p align="center">৭</p> <p>- Steel Shutter এর পরিবর্তে কাঠ/বাঁশ-এর সাটার ব্যবহার করা হচ্ছে।</p>
প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	CRMIDP																			
চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	০৪.১১.২০১৯ খ্রিঃ																			
ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	SE & EET (JV) Baghmara, Sadar, Mymensingh.																			
প্রাক্কলিত মূল্য	১,৮৮,০০,০০০.০০ টাকা																			
চুক্তিমূল্য	১,৭৪,৩৮,৯১৩.৬৫ টাকা																			
চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাঙ্গির তারিখ	৩০.১১.২০২০ খ্রিঃ																			
বর্তমান অগ্রগতি	৬০%																			
						<p align="center">৮</p> <p>- কাঠ/বাঁশ-এর সাটার অপসারণ স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী Steel Shutter ব্যবহার নিশ্চিত করতঃ ছাদের ঢালাই করতে হবে।</p> <p>- দ্রুত কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>- সাইটে সুবিধাজনক স্থানে সাইনবোর্ড (৩'x৫') এবং ভবনের 3D-View প্রিন্ট করে স্থাপন করতে হবে।</p>														

বিশেষ মন্তব্য :


- চুক্তি সম্পাদনের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় এবং সময় বর্ধনের বিষয়েও কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এতে প্রতিময়মান হচ্ছে, Contract Management এবং Time Management এর বিষয়ে ক্রমকারী কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এ বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। অন্যথায় পরবর্তীতে সৃষ্ট যে কোন জটিলতার জন্য ক্রমকারী অধ্যাৎ সংশ্লিষ্ট নিবন্ধী প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী দায়ী থাকবেন।


 (শাকিল হোসেন)
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী



 (শপন কান্তি পাল)
 প্রকল্প পরিচালক

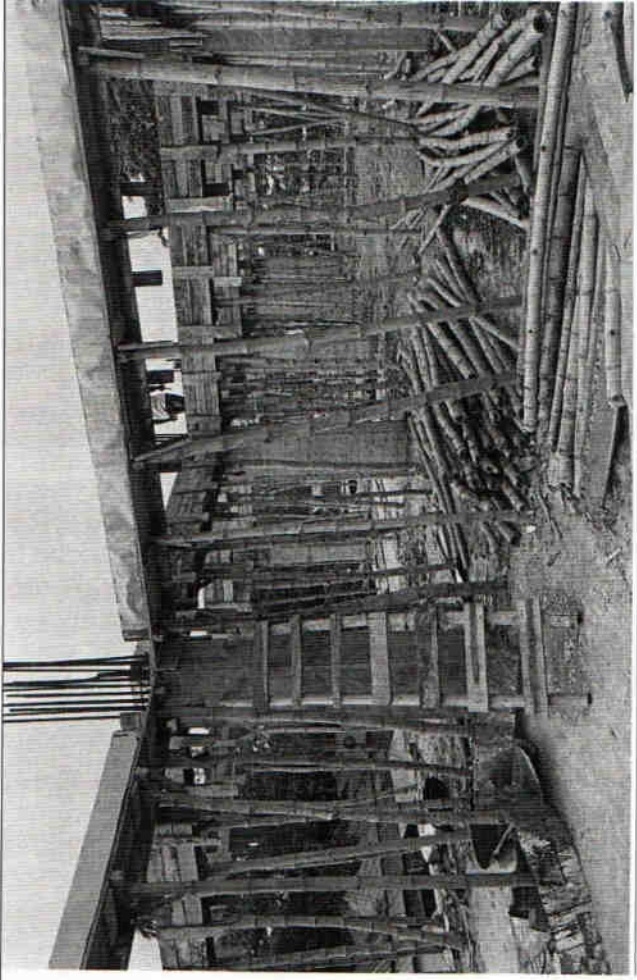


Tarakanda Dokkhin Bazar, under Upzila : Tarakanda, District : Mymensingh.

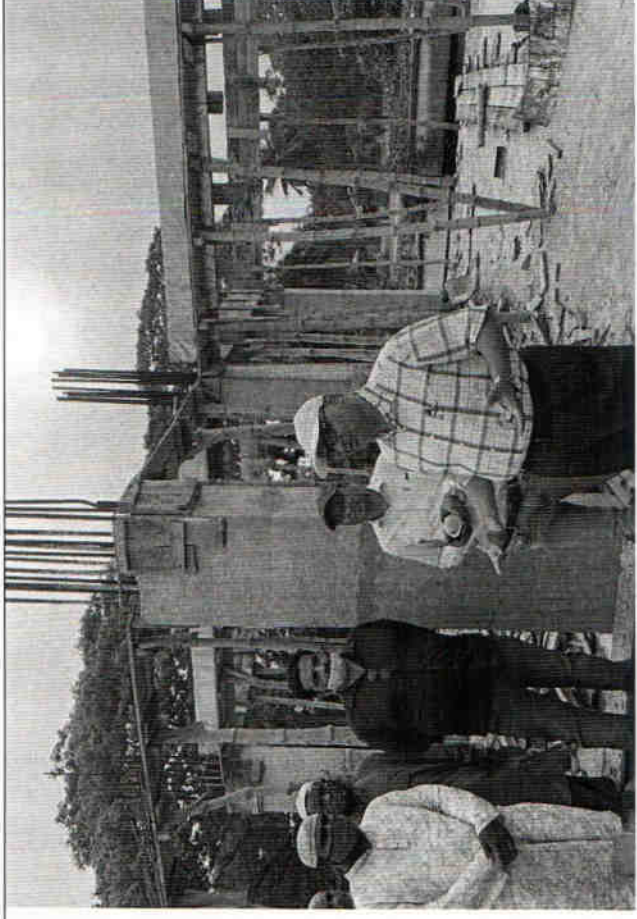

Tarakanda Dokkhin Bazar, under Upzila : Tarakanda, District : Mymensingh.

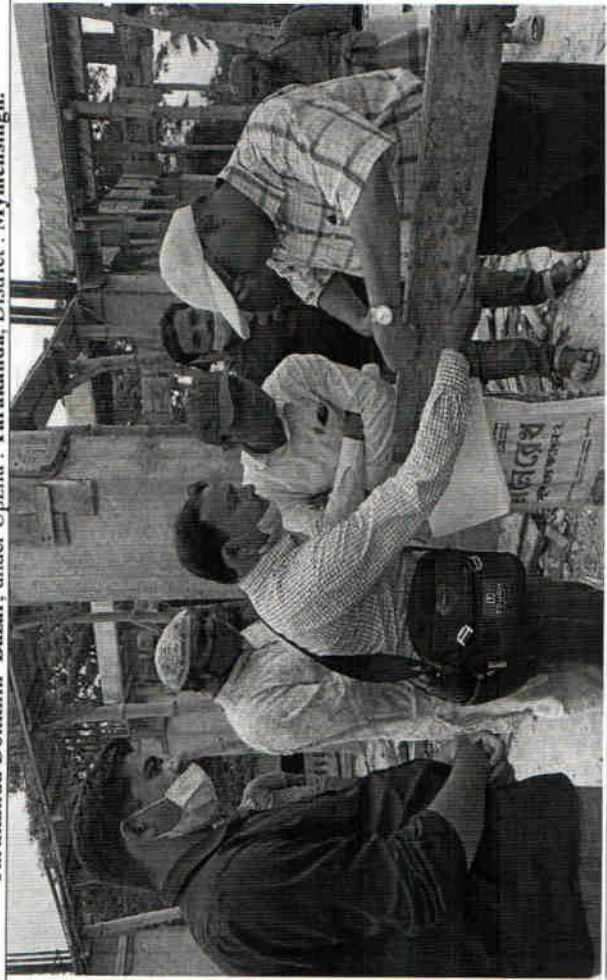

Tarakanda Dokkhin Bazar, under Upzila : Tarakanda, District : Mymensingh.

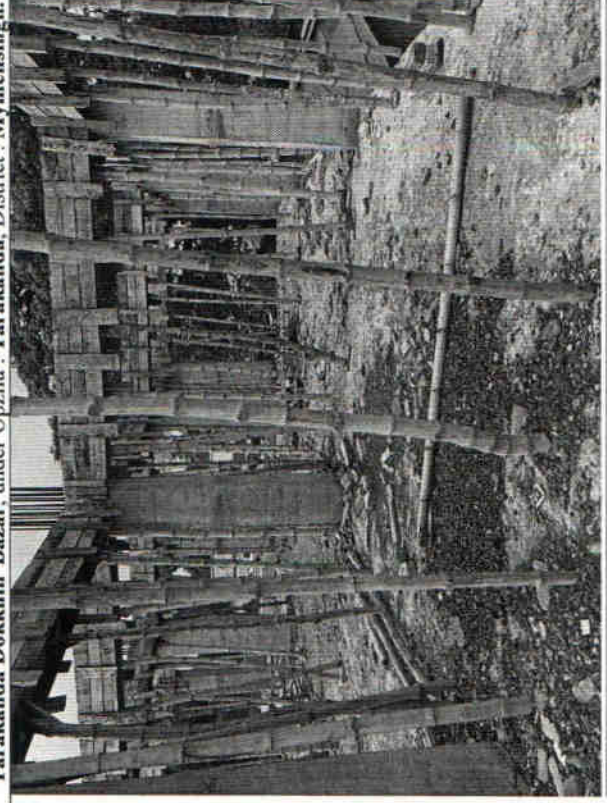

Tarakanda Dokkhin Bazar, under Upzila : Tarakanda, District : Mymensingh.

Ram

Ram

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

পরিদর্শন প্রতিবেদন


উপজেলা : ফুলপুর


বিভাগ : ময়মনসিংহ জেলা : ময়মনসিংহ


ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত ক্ষীমের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত ক্ষীমসমূহের পরিলক্ষিত ক্রটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা																
				Item	Design Specification	Field Observation														
১	২৯/৩/২০২২ খ্রি:	ময়মনসিংহ/ ফুলপুর	<p>Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4-Storeyed Foundation) at Bowla Bazar, under Upzila : Phulpur, District : Mymensingh.</p> <table border="1"> <tr> <td>প্রকল্প/কর্মসূচির নাম</td> <td>CRMIDP</td> </tr> <tr> <td>চুক্তি সম্পাদনের তারিখ</td> <td>২০.০২.২০২০ খ্রিঃ</td> </tr> <tr> <td>ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা</td> <td>Noor Hossain-Sneha Enterprise (JV) DB road, Sadar, Mymensingh.</td> </tr> <tr> <td>প্রাক্কলিত মূল্য</td> <td>২,১৩,০০,০০০.০০টাকা</td> </tr> <tr> <td>চুক্তিমূল্য</td> <td>১,৯২,৪৫,৬৩৯.৫২ টাকা</td> </tr> <tr> <td>চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ</td> <td>৩১.০৩.২০২২ খ্রিঃ</td> </tr> <tr> <td>বর্তমান অগ্রগতি</td> <td>৪৫%</td> </tr> </table>	প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	CRMIDP	চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	২০.০২.২০২০ খ্রিঃ	ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	Noor Hossain-Sneha Enterprise (JV) DB road, Sadar, Mymensingh.	প্রাক্কলিত মূল্য	২,১৩,০০,০০০.০০টাকা	চুক্তিমূল্য	১,৯২,৪৫,৬৩৯.৫২ টাকা	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	৩১.০৩.২০২২ খ্রিঃ	বর্তমান অগ্রগতি	৪৫%	৫	৬	৭
প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	CRMIDP																			
চুক্তি সম্পাদনের তারিখ	২০.০২.২০২০ খ্রিঃ																			
ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা	Noor Hossain-Sneha Enterprise (JV) DB road, Sadar, Mymensingh.																			
প্রাক্কলিত মূল্য	২,১৩,০০,০০০.০০টাকা																			
চুক্তিমূল্য	১,৯২,৪৫,৬৩৯.৫২ টাকা																			
চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	৩১.০৩.২০২২ খ্রিঃ																			
বর্তমান অগ্রগতি	৪৫%																			
০২।	২৯/৩/২০২২ খ্রি:	ময়মনসিংহ/ ফুলপুর	<p>ক্রটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থাদি ও মন্তব্য</p>	<p>Shuttering with Plain 16 BWG Steel Sheet fitted Over 38mm×38mm×5m m MS angle and 25mm×25mm×5m m FI bar frame and 38mm/50mm Steel or GI pipe Props suitably braced and 12 BWG Steel Sheet plate box of proper size Where required.)</p>	<p>৮</p> <p>- কাঠ/বাঁশ-এর অপসারণ পেসসিফিকেশন অনুযায়ী Steel Shutter ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ঢালাই করতে হবে। - দ্রুত কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</p> <p>- সাইটে সুবিধাজনক স্থানে সাইনবোর্ড (৩'×৫') এবং ভবনের 3D-View প্রিন্ট করে স্থাপন করতে হবে।</p>															

বিশেষ মন্তব্য :


- চুক্তি সম্পাদনের পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয় এবং সময় বর্ধনের বিষয়ে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। এতে প্রতিময়মান হচ্ছে, Contract Management এবং Time Management এর বিষয়ে ক্রমকারী কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এ বিষয়ে অধিকতর যত্নবান হওয়া উচিত। অন্যথায় পরবর্তীতে সৃষ্ট যে কোন জটিলতার জন্য ক্রমকারী অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী দায়ী থাকবেন।


 (শাকিল হাঞ্জাদার)
 উপ-সহকারী প্রকৌশলী



 (স্বপন কান্তি পাল)
 প্রকল্প পরিচালক

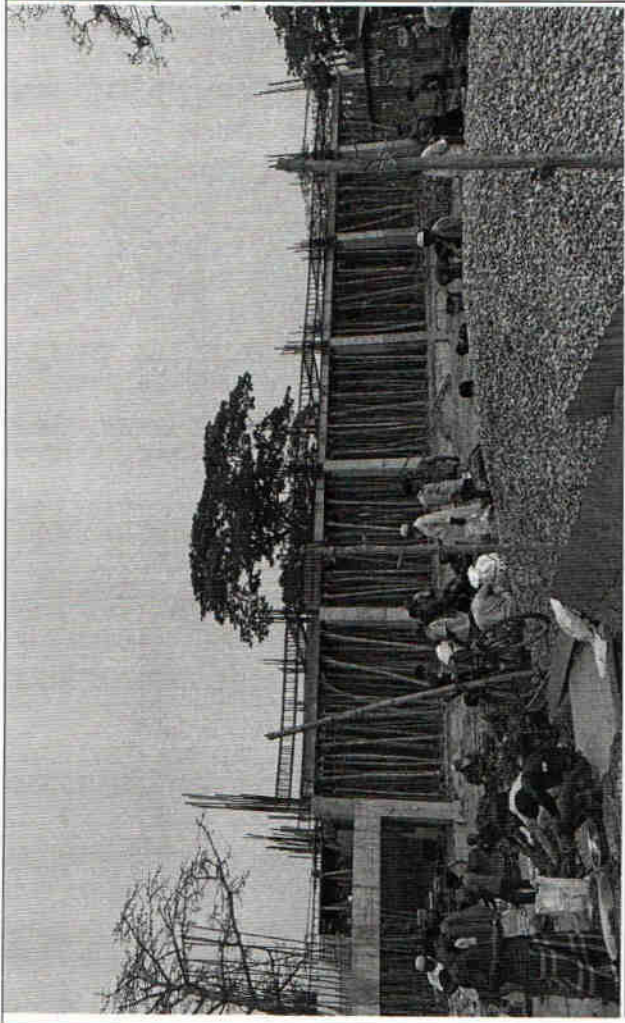

Bowla Bazar, under Upzila : Phulpur, District : Mymensingh.

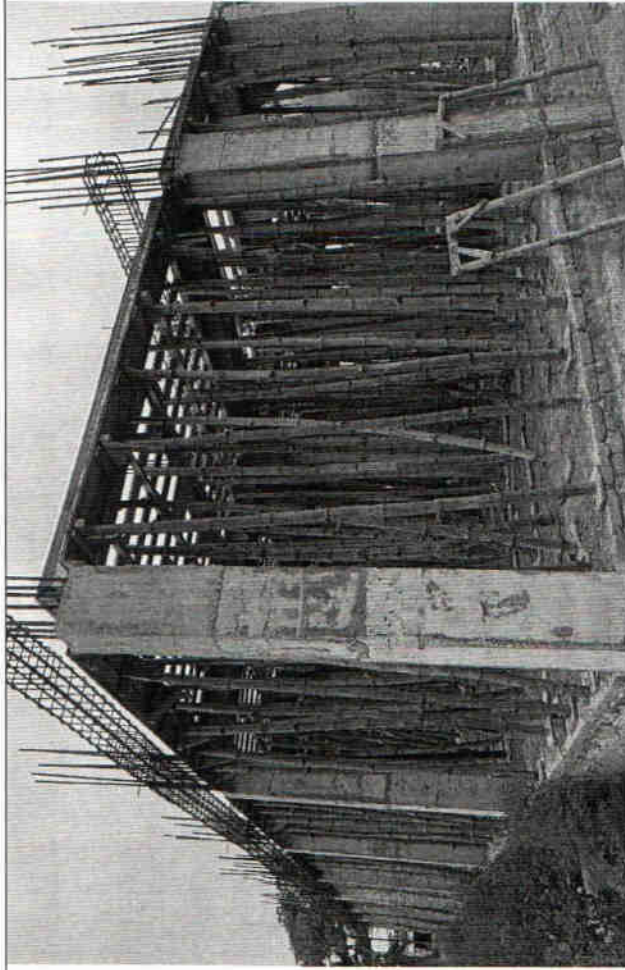

Bowla Bazar, under Upzila : Phulpur, District : Mymensingh.

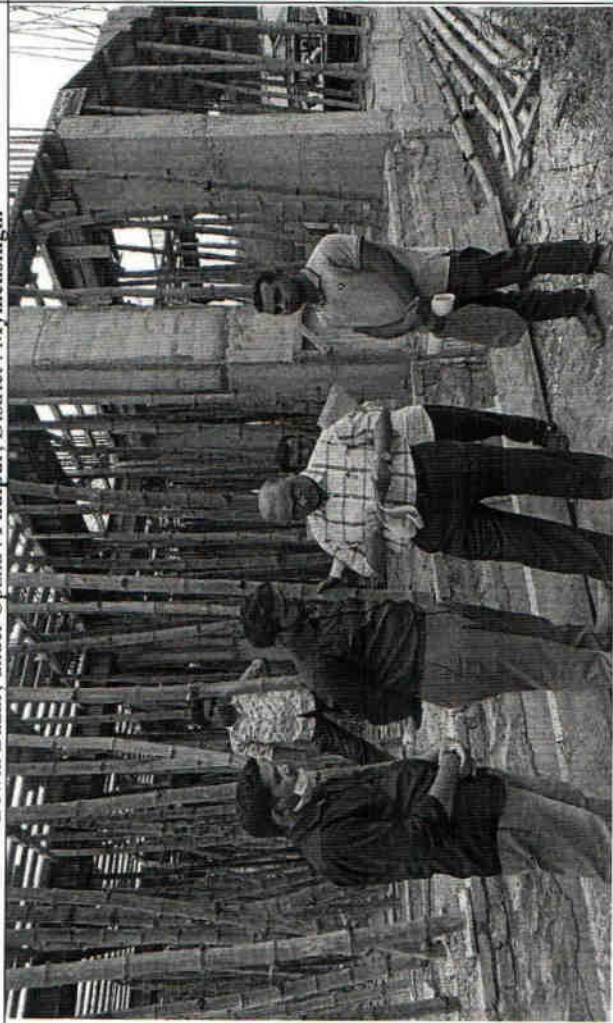

Bowla Bazar, under Upzila : Phulpur, District : Mymensingh.



Bowla Bazar, under Upzila : Phulpur, District : Mymensingh.

Bowl

Bowl

দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)


পরিদর্শন প্রতিবেদন


উপজেলা : হালুয়াঘাট

বিভাগ : ময়মনসিংহ জেলা : ময়মনসিংহ

ক্রমিক নং	পরিদর্শনের তারিখ	জেলা ও উপজেলা	পরিদর্শনকৃত স্কিমের বিবরণ (সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ, বর্তমান অগ্রগতি, প্রকল্পের নাম ইত্যাদি সহ)	পরিদর্শনকৃত স্কিমসমূহের পরিলক্ষিত ক্রটি/সমস্যা সমূহের বর্ণনা			ক্রটি সংশোধন/সমস্যা সমূহ সমাধানের জন্য সুপারিশমালা/গৃহীত ব্যবস্থাদি ও মন্তব্য
				Item	Design Specification	Field Observation	
১	২৯/৩/২০২২ খ্রিঃ	ময়মনসিংহ/ হালুয়াঘাট	৪ Construction of 2-Storeyed Rural Market Building (With 4-Storeyed Foundation) at Baghaitola Hat. , under Upzila : Haluaghat, District : Mymensingh.	৫ Column at Ground Floor	৬ -	৭ - গ্রাউন্ড ফ্লোরের কলাম কাস্টিং এর কাজ চলমান।	৮ - কলাম, বীম ও ট্রাব-এ স্টীল সটার-এর ব্যবহার নিশ্চিত পূর্বক টলাই কাজ সম্পন্ন করতে হবে। - দ্রুত কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। - সাইটে সুবিধাজনক স্থানে সাইনবোর্ড (৩'x৫') এবং ভবনের 3D-View প্রিন্ট করে স্থাপন করতে হবে।
০২।			৪ প্রকল্প/কর্মসূচির নাম চুক্তি সম্পাদনের তারিখ ঠিকাদারের নাম ও ঠিকানা প্রাক্কলিত মূল্য চুক্তিমূল্য চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ বর্তমান অগ্রগতি	৫ Cloumn at Ground Floor Signboard & 3D View	৬ -	৭ -	৮ CRMIDP ঃ ১৩.১২.২০২০ খ্রিঃ ঃ M/S. Zerin Enterprise Kalapara, Dishmail, Sherpur, Bogora. ঃ ৩,২৬,০০,০০০.০০টাকা ঃ ২,৭৫,৪৩,২১০.০০ টাকা ঃ ৩০.০৬.২০২২ খ্রিঃ ঃ ৫০%


(শাকিল হোসেন)
উপ-সহকারী প্রকৌশলী


(শাকিল হোসেন)
প্রকল্প পরিচালক

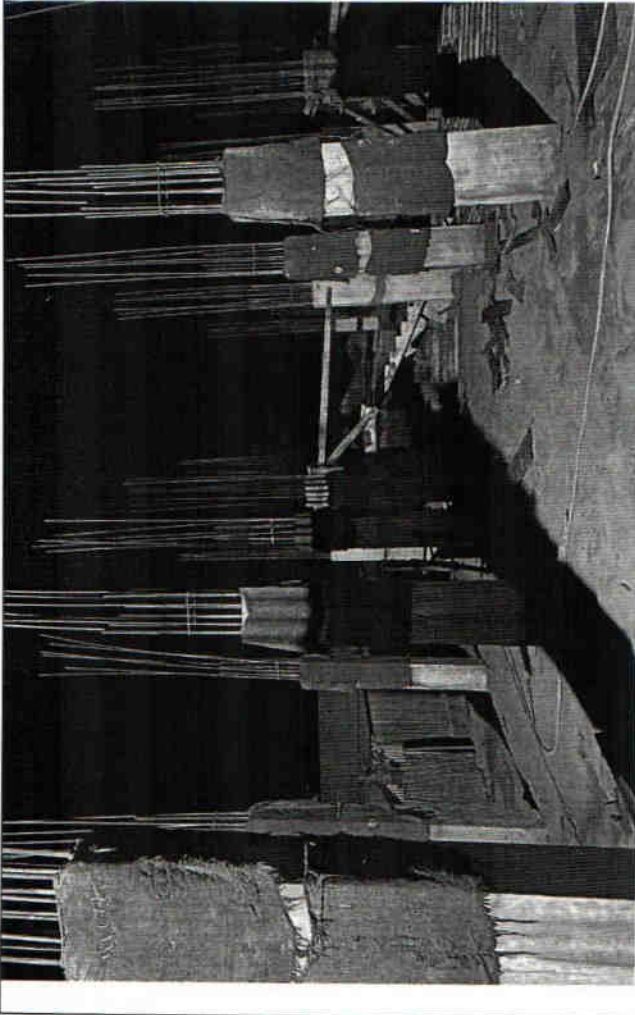

Baghaitola Hat., under Upzila : Haluaghat, District : Mymensingh.



Baghaitola Hat., under Upzila : Haluaghat, District : Mymensingh.



Baghaitola Hat., under Upzila : Haluaghat, District : Mymensingh.



Baghaitola Hat., under Upzila : Haluaghat, District : Mymensingh.

Ram

Ram
